

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1  
DOLOMITI

# PNRR e cantieri: aggiornamento

**31 maggio 2023**



# CANTIERI PNRR

---



**16 milioni di euro**  
**per case della comunità, ospedali di**  
**comunità e COT**




# CANTIERI PNRR




## Case della Comunità:

- Belluno 5,5 mln
- Agordo 2,5 mln
- Pieve 1,75 mln
- Feltre 4 mln



## Ospedali di Comunità:

- Agordo 50mila
- Auronzo 450mila
- Feltre 1,5 mln



## COT:


- Belluno 331mila
- Feltre 20mila



# CANTIERI PNRR

## Principali scadenze:

- **PROGETTO DEFINITIVO: 15/10/2022**
- **ASSEGNAZIONE CIG: 31/03/2023**
- **STIPULA CONTRATTO LAVORI: 30/09/2023**



**tutti i progetti anticipano le scadenze**



## Casa comunità BELLUNO con Centro prelievi area San Gervasio importo di progetto 5,5 mln



Vista 1



Vista 2



Vista 3



Vista 4

- *Progetto definitivo: 04/10/22*
- *CIG: 20/03/23*
- *stipula contratto: 03/05/23*
  
- ***lavori consegnati: 29/05/2023***
- ***ultimazione prevista: 28/12/2024***



# CANTIERI PNRR

## Casa comunità Pieve (ex poliambulatorio)

importo di progetto 1,75 mln




- *Progetto definitivo: 01/09/2022*
- *CIG: 28/11/2022*
- *stipula contratto: 27/04/23*
  
- *prima gara deserta, adesione ad Accordo Quadro Az. Zero*
- *Consegna lavori prevista al 08/06/2023*



# CANTIERI PNRR

## Casa comunità Feltre (ex casa di cura Bellati) *importo di progetto 4 mln*

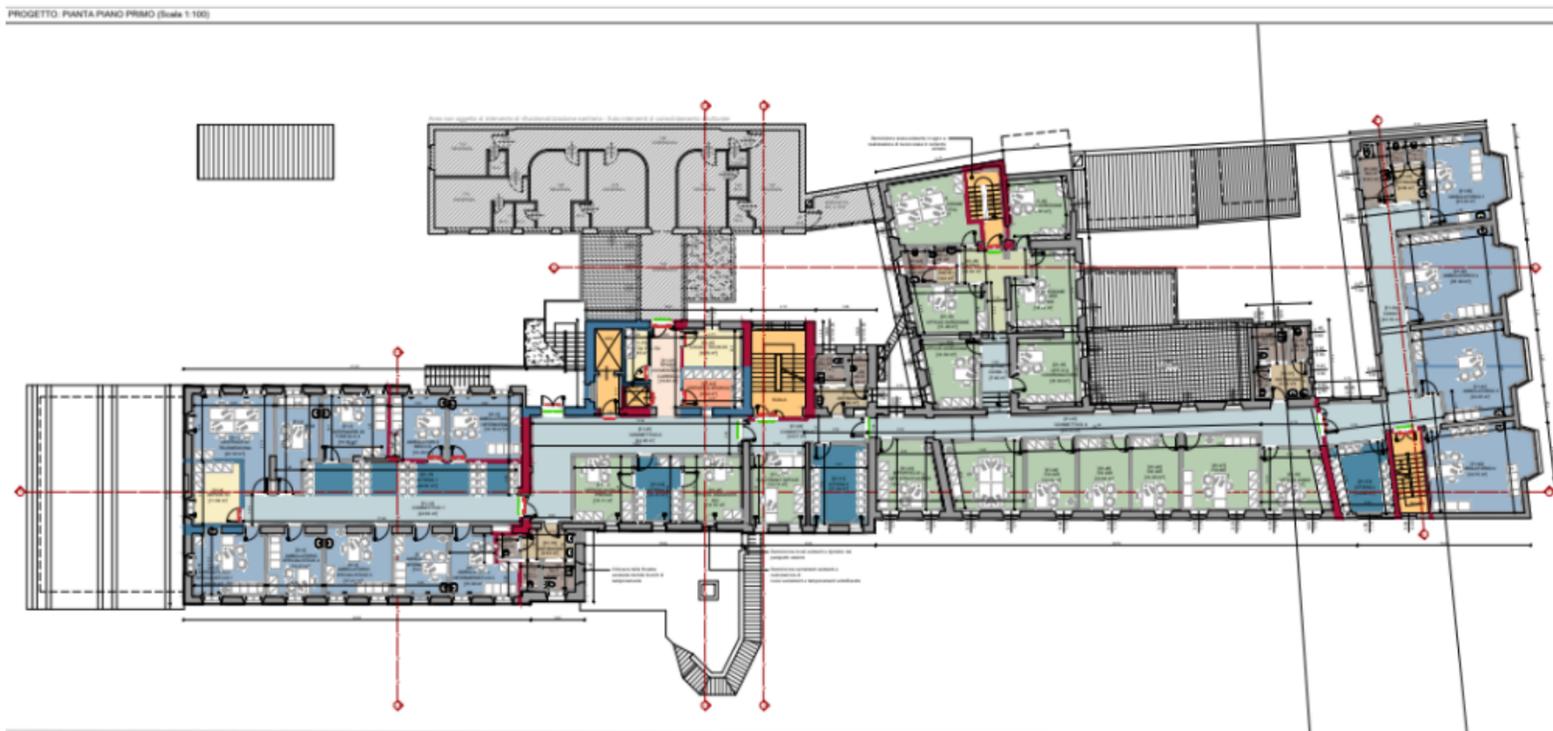

- *Progetto definitivo: 02/08/22*
- *CIG: 02/11/2022*
- *stipula contratto: 19/12/22*
  
- ***lavori consegnati il 13/03/2023***
- ***ultimazione prevista: 20/10/2024***



# CANTIERI PNRR

## Casa comunità Agordo (ospedale)

*importo di progetto 2,5 mln*



- *Progetto definitivo: 02/08/22*
- *CIG: 02/11/2022*
- *stipula contratto: 09/01/23*
  
- ***lavori consegnati: 27/03/2023***
- ***ultimazione prevista: 30/11/2024***





# CANTIERI PNRR

## Ospedale di Comunità Auronzo - 21 PL

Ospedale di Auronzo

importo di progetto: 450.000 euro



- *Progetto definitivo: 04/07/2022*
- *CIG: 22/09/2022*
- *stipula contratto: 09/11/2022*
  
- ***lavori consegnati il 16/01/2023***
- ***ultimazione prevista 31/12/2023***



# CANTIERI PNRR

## Ospedale di Comunità Agordo - 17 PL

Ospedale di Agordo

importo di progetto: 50.000 euro



- *sostituzione infissi*
- *lavori terminati, in corso*  
*approvazione risultanze finali*



## Cot Belluno

**331.000 euro**

- *Progetto definitivo: 08/08/2022*
- *CIG: 31/10/2022*
- *stipula contratto: 12/12/2022*
  
- ***lavori consegnati il 23/01/2023***
- ***ultimazione prevista al 11/06/2023***

## Cot Feltre

**20.000 euro**

- solo fornitura e posa (controsoffitti con staffaggi antisismici e installazione apparecchiature di natura impiantistica)
- in corso approvazione risultanze finali



**Oltre ai cantieri:  
Le grandi apparecchiature  
finanziate col PNRR**



	<b>FONDI AZIENDALI</b>	<b>PNRR</b>
	<b>Importo progetto per lavori</b>	<b>Costo apparecchiatura</b>
<b>Risonanza Magnetica <u>BL</u></b>	850.000,00 €	921.472,00 €
<b>Gamma camera con TAC Belluno</b>	180.000,00 €	675.000,00 €
<b>Radiologia <u>BL</u> (2 DR + 1 telecomandato)</b>	650.000,00 €	808.900,00 €
<b>Radiologia Pieve (1 telecomandato)</b>	195.000,00 €	247.700,00 €
	<b>1.875.000,00 €</b>	<b>2.653.072,00 €</b>




# Principali cantieri in corso



# PRINCIPALI CANTIERI

## SALA IBRIDA BELLUNO

**3,25 milioni di euro**  
*lavori in corso*

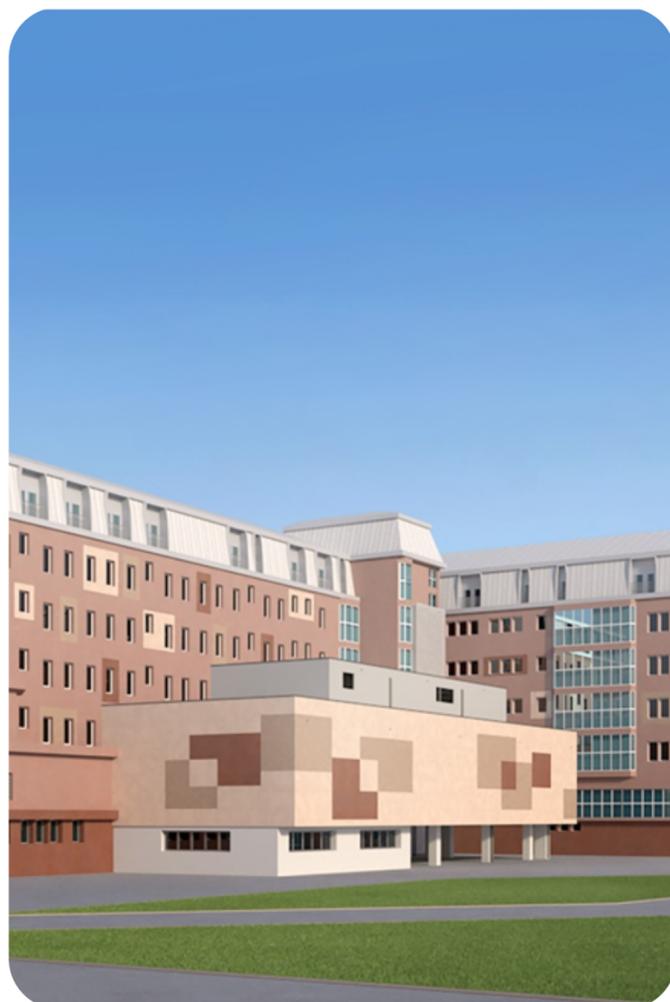

## ANTISISMICA BELLUNO

**45 milioni di euro**  
*lavori in corso*  
*ultimazione prevista:*  
**dicembre 2026**



## RISTRUTTURAZIONE LAMON

**5 milioni di euro**  
*ultimazione prevista:*  
**settembre 2023**  
**cofinanziamento FCC**  
**+1,9 mln**  
**riqualificazione**  
**parcheggio**





## **PRONTO SOCCORSO AGORDO**

**3 mln**

**in fase di finitura fase 3  
camera calda**



## **RIQUALIFICA CABINE TRASFORMAZIONE BL**

**6,4 mln**

**lavori in corso**





# CANTIERI IN CORSO

## **ANTINCENDIO AGORDO**

Collaudo in corso

770 mila

## **ANTINCENDIO AURONZO**

in corso

630 mila

## **ANTINCENDIO PIEVE**

in corso

950 mila

## **ANTISISMICA FELTRE**

in corso progettazione  
fattibilità tecnica

32 milioni di euro

## **PIASTRA ENDOSCOPICA FELTRE**

in corso di redazione  
progetto di fattibilità

2 milioni di euro
